


Gestion de l'avancement réel du chantier par phase

Depuis l'étude d'exécution, je souhaite gérer l'avancement réel du chantier.



Aller dans l'étude d'exécution, puis cliquer sur Gestion suivi phase / poste de travaux



Depuis la fiche chantier, vous

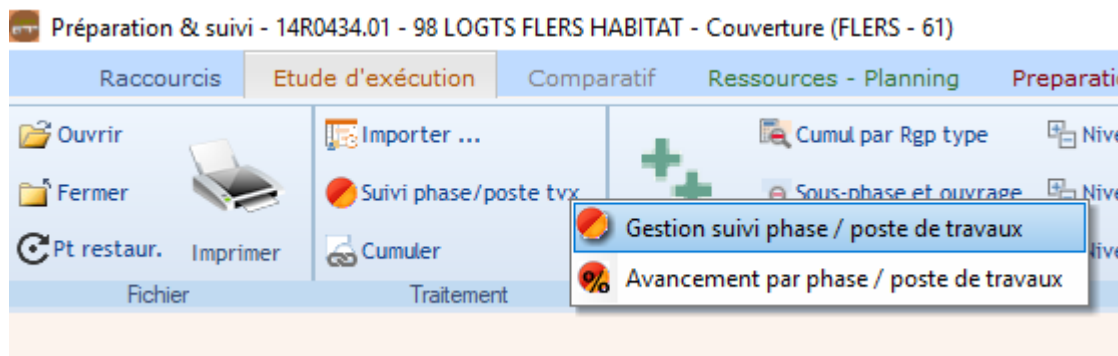

1. Je choisis les phases que je souhaite suivre :

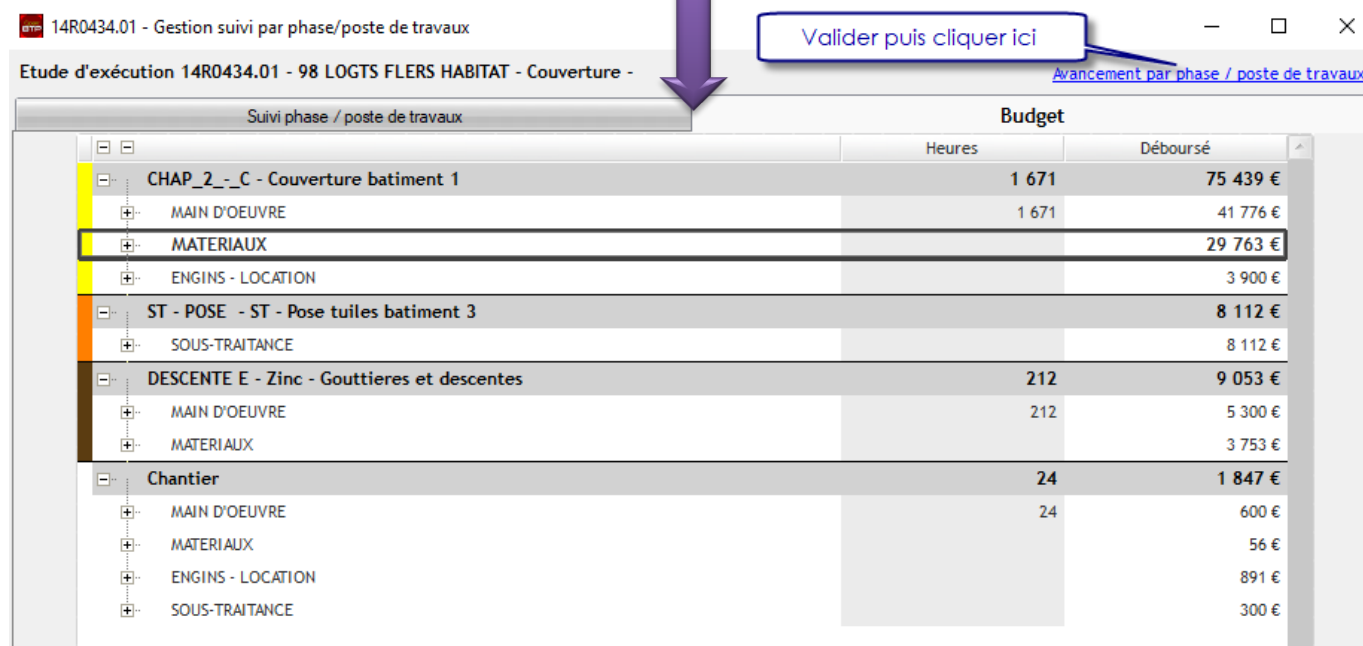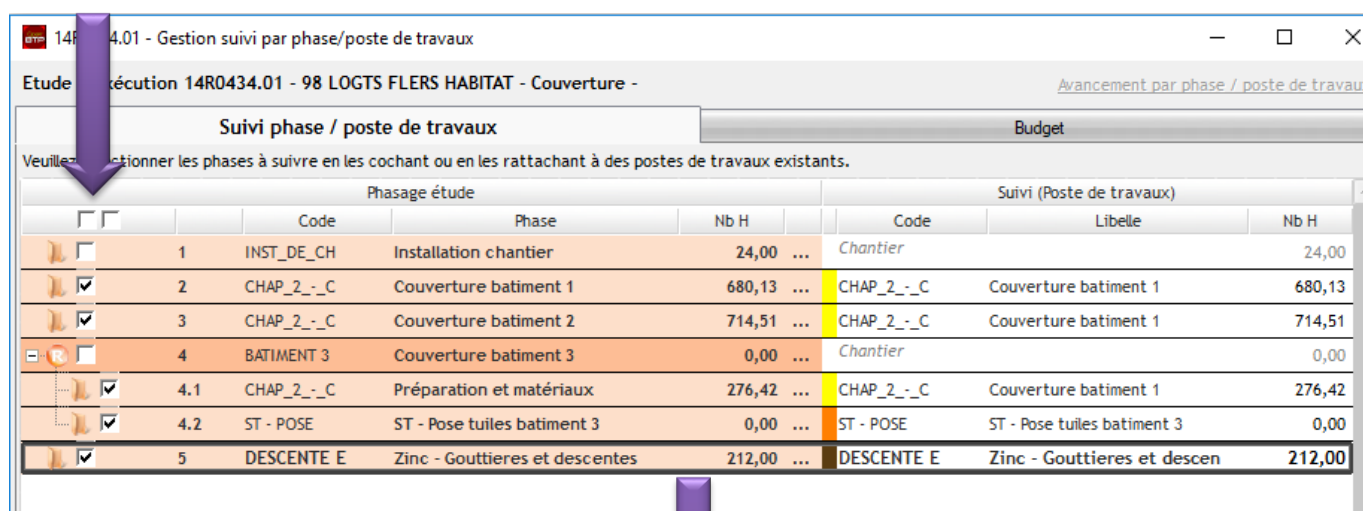

Vous pouvez alors créer un nouvel avancement (en créant une date d'arrêt) comme suit :

Avancement par phase / poste de travaux

Raccourcis Suivi phase/Poste de travaux Impression

Chantier 14R0434.01 Couverture (FLERS) Arrêté

	Etude		Avancement au 30/09/14		Realisation au 30/09/14		Ecart	
	Heures	Déboursé	% avct	% avct	Heures	Déboursé	Heures	Déboursé

Avancement par phase/poste de travaux

Attention, les modifications ultérieures de l'étude d'exécution ne seront pas répercutées dans cet arrêté d'avancement. Si vous devez effectuer des modifications, faites les avant de créer l'avancement.

Chantier 14R0434.01 Arrêté **JUIN 2018**

Commentaire Avancée estimée au 30/06/18 par Alain

Texte libre / facultatif

Arrêté préc.

Le 21/09/2018, par asuperviseur

Avancement par phase / poste de travaux

Raccourcis Suivi phase/Poste de travaux Impression

Chantier 14R0434.01 Couverture (FLERS) Arrêté **JUIN 2018**

	Etude		Avancement au 30/06/2018		Réalisation au 30/06/2018		Ecart	
	Heures	Déboursé	% avct	% avct	Heures	Déboursé	Heures	Déboursé
CHAP_2_-_C - Couverture bâtiment 1	1 671	75 439 €	0,00%	0,00%				
MAIN D'OEUVRE	1 671	41 776 €						
MATERIAUX		29 763 €						
ENGINS - LOCATION		3 900 €						
ST - POSE - ST - Pose tuiles bâtiment 3	8 112	8 112 €	0,00%	0,00%				
SOUS-TRAITANCE		8 112 €						
DESCENTE E - Zinc - Gouttières et desc	212	9 053 €	0,00%	0,00%				
MAIN D'OEUVRE	212	5 300 €						
MATERIAUX		3 753 €						
Chantier	24	1 800 €	0,00%	0,00%	1 220	74 272 €	1 220	74 272 €
MAIN D'OEUVRE					1 220	31 059 €	1 220	31 059 €
MATERIAUX						36 486 €		36 486 €
ENGINS - LOCATION						2 248 €		2 248 €
SOUS-TRAITANCE						4 480 €		4 480 €
DEBOURSE TOTAL	1 907	94 451 €	0,00%		1 220	74 272 €	1 220	74 272 €
MAIN D'OEUVRE	1 907	47 676 €			1 220	31 059 €	1 220	31 059 €
MATERIAUX		33 572 €				36 486 €		36 486 €
ENGINS - LOCATION		4 791 €				2 248 €		2 248 €
SOUS-TRAITANCE		8 412 €				4 480 €		4 480 €

- Soit on génère un avancement général sur l'ensemble de la phase
=> saisie directe à la place du **0,00%**

- Soit on détaille avec les différents composants du devis
=> clic sur les trois points ...

Supprimer Propriétés Cdes fournisseurs Factures + BL non facturés Factures

Le 21/09/2018, par asuperviseur

Avancement par phase / poste de travaux - Saisie par ligne

CHAP_2_-_C - Couverture ... 0 %
 ST - POSE - ST - Pose tuiles ... 0 %
 DESCENTE E - Zinc - Gouttie... 0 %
 Chantier 0 %

CHAP_2_-_C - Couverture bâtiment 1

Etude : Heure 1 671 Déboursé 75 439 € Avancement au 30/06/2018 : 0,98 % Heure 19 Déboursé 742 €

N°	Code	Désignation	Un.	Qté Tot	Nb H Tot	PA Tot	% avct préc	% avct
2 Couverture bâtiment 1 (14C122PL50)								
2.1	ECHPIEDFC	Echafaudage vertical de pied pour protecti...	M²	317,720	95,32	2 382,90 €	0,00%	20,00%
2.2	ENLEVGRAVAT	Enlèvement et évacuation des gravats à la ...	Ens	0,340		1 326,00 €	0,00%	20,00%
2.3	STSPANFLEX	Sous toiture avec écran et contre liteaux d...	M²	605,200	72,62	2 789,52 €	0,00%	30,00%
2.4	CTLDR10	Couverture en tuile béton grand moule à e...	M²	605,200	242,08	10 708,89 €	0,00%	0,00%
2.5	CTLDR20	Faitage Double Romane avec faitière de 42 ...	ML	52,270	15,68	1 159,48 €	0,00%	0,00%
2.6	CTLDR201	About de faitière de 42 Double Romane.	U	5,790	0,58	44,06 €	0,00%	0,00%
2.7	CTLDR43	Soin d'héberge avec tablier en zinc naturel...	ML	25,830	23,25	987,20 €	0,00%	0,00%
2.8	CTLDR41	Rive latérale rallongée Double Romane avec ...	ML	49,860	24,93	1 567,87 €	0,00%	0,00%
2.9	CTLDR41	Rive latérale Double Romane avec tuile de ri...	ML	23,690	8,29	593,20 €	0,00%	0,00%
2.10	SVMPC100A	Sortie de ventilation de chute avec mousti...	U	6,480	4,86	336,90 €	0,00%	0,00%
2.11	SVMCD160T	Sortie VMC Ø 160 en PVC pour couverture ...	U	5,110	3,83	426,38 €	0,00%	0,00%
2.12	CTLDR50	Tuile châtière grillagée Double Romane pou...	U	30,670	3,07	281,86 €	0,00%	0,00%

Une fois validé, l'avancement moyen de la phase est recalculé et un état est à votre disposition qui compare le budget initial, l'avancement, la réalisation (débourrés chantier).

Avancement par phase / poste de travaux

Raccourcis Suivi phase/Poste de travaux Impression

Chantier 14R0434.01 Couverture (FLERS) Arrêté JUIN 2018

	Etude			Avancement au 30/06/2018			Réalisation
	Heures	Déboursé	% avct	% avct	Heures	Déboursé	
CHAP_2_-_C - Couverture bâtiment 1	1 671	75 439 €	0,00%	2,09% ..	41	1 579 €	
ST - POSE - ST - Pose tuiles bâtiment 3		8 112 €	0,00%	0,00% ..			
DESCENTE E - Zinc - Gouttieres et desc	212	9 053	0,00%	0,00% ..			
Chantier			0,00%	0,00% ..			1 220

Sélection de votre édition

1-sélectionner votre édition

Thèmes et éditions

Analyse

Suivi avancement (Facture + BL)

Vous avez ici le rappel de l'avancement précédent
