


# Comment activer le suivi phase / poste de travaux dans l'étude d'exécution ?

Optim BTP permet de suivre vos achats **par phase / poste de travaux**.

## Paramétrage


Pour avoir cette gestion, il est nécessaire d'activer l'option dans les paramètres avec les droits superviseur.

Avec les droits superviseur, allez dans paramètres > Système > Application > Rubrique Affaire, chantier, prévisions financières et cochez la case « **Activer la gestion des avancements depuis la prépa-suivi de chantier** ».

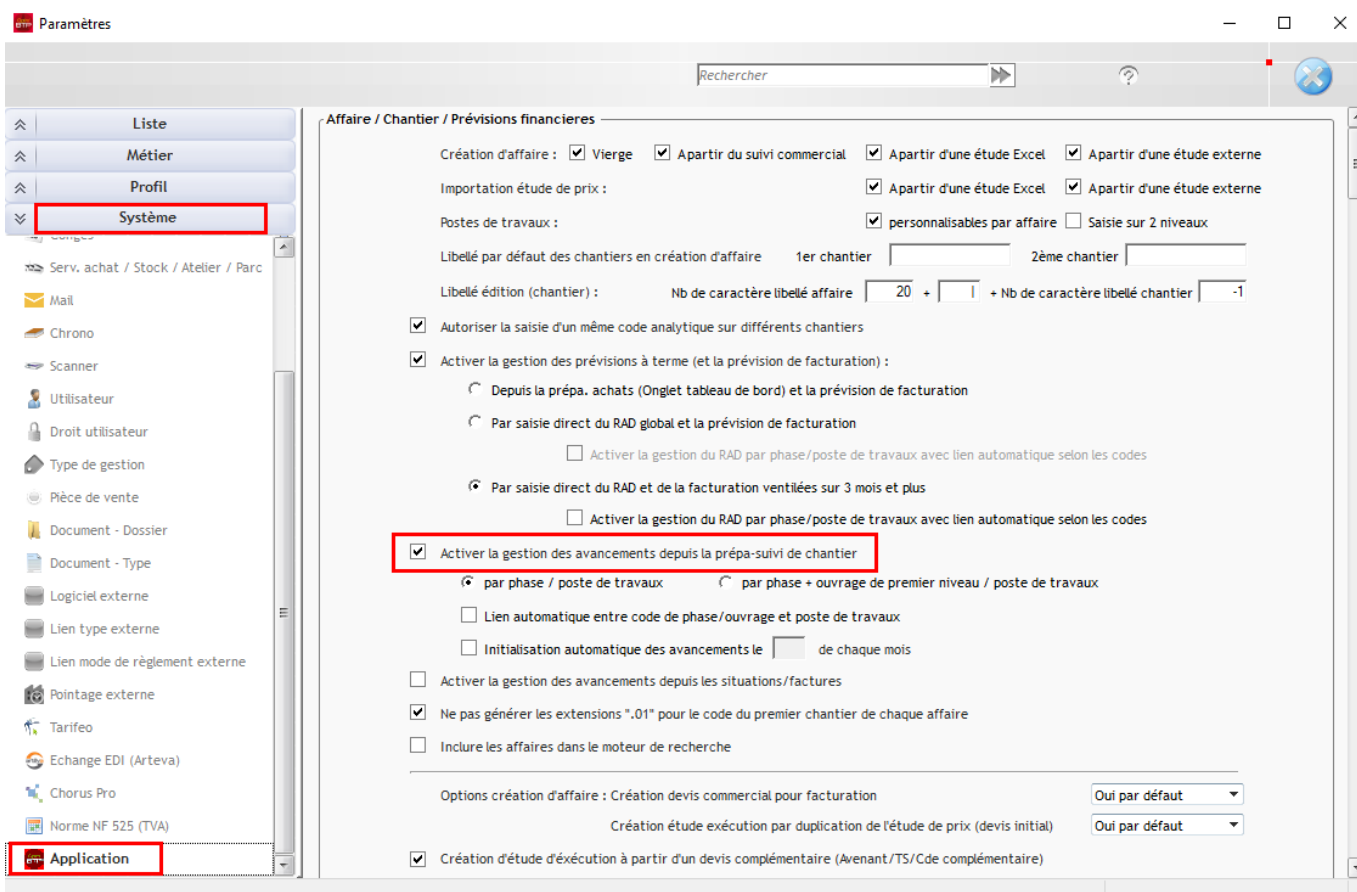

The screenshot shows the 'Paramètres' window with the 'Système' menu expanded to 'Application'. The 'Affaire / Chantier / Prévisions financières' section is visible, with the checkbox 'Activer la gestion des avancements depuis la prépa-suivi de chantier' checked and highlighted. Below it, the radio button 'par phase / poste de travaux' is selected. The 'Application' menu item in the left sidebar is also highlighted.

Fermez et relancez Optim'BTP afin que la modification soit prise en compte.



Depuis l'étude d'exécution (rappel : fiche chantier > prépa/suivi), le suivi par phase / poste travaux est activé.

Préparation & suivi - 14R0434.01 - 98 LOGTS FLERS HABITAT - Couverture (FLERS - 61)

Raccourcis | Etude d'exécution | Comparatif | Ressources - Planning | Préparation achat | Sous traitance | RAD

Ouvrir | Fermer | Pt restaur. | Imprimer | Cumuler | Importer ... | Générer ST | Cumul par Rgp type | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau | Type : Tous | Unite : Tous | Mot clé : | Ajouter/Saisir | Monter | Abaisser | Modifier ligne | Descendre | Hausser | Changement article | Appl. multiple | Supprimer

Fichier | Traitement | Affichage | Filtre article | Edition

**Suivi phase/poste tx** | **Gestion suivi phase / poste de travaux** | **Avancement par phase / poste de travaux**

**1 - Couverture**

N°	Code	Désignation	Type	Un.	Qté	PAU	PAT
1		<b>Installation chantier (Du 08/12/2014 au 10/12/2014)</b>			<b>1,000</b>	<b>1 847,000 €</b>	<b>1 847,00 €</b>
						MAIN D'OEUVRE	600,00 €
						MATERIAUX	56,00 €
						MATERIEL et LOCATION	891,00 €
						SOUS-TRAITANCE	300,00 €
1.1	MISECHEC	Mise en place d'une roulotte de chantier comprenar		Ens	1,000	1 447,000 €	1 447,00 €
1.1.1	Chant	Chantier	Chant	H	8,000	25,000 €	200,00 €
1.1.2	ST_LIBRE	ROULOTTE DE CHANTIER	Locat	J	60,000	14,850 €	891,00 €
1.1.3	ST_LIBRE	TRANSPORT	ST	Ens	1,000	60,000 €	60,00 €
1.1.4	ST_LIBRE	RECHARGE GAZ PROPANE	MT	U	2,000	28,000 €	56,00 €
1.1.5	ST_LIBRE	VIDANGE	ST	U	2,000	120,000 €	240,00 €
1.2	CLOTURE	Clôture de chantier par grilles Heras.		Ens	1,000	400,000 €	400,00 €
1.2.1	Chant	Chantier	Chant	H	16,000	25,000 €	400,00 €
2		<b>Couverture bâtiment 1 (Du 11/12/2014 au 30/12/2014)</b>			<b>1,000</b>	<b>28 473,094 €</b>	<b>28 473,09 €</b>

**Etude (Sélectionner tout)**

- 1 - Installation chantier
- 2 - Couverture bâtiment 1
- 3 - Couverture bâtiment 2
- 4 - Couverture bâtiment 3
  - 4.1 - Préparation et matériaux
  - 4.2 - ST - Pose tuiles bâtiment 3
- 5 - Zinc - Gouttières et descentes
- 6 - COUVERTURE TUILES
  - 6.1 - CHAPITRE 2 - COUVERTURE - ZINGUERIE
- 7 - COUVERTURE TUILES
  - 7.1 - INSTALLATION DE CHANTIER
  - 7.2 - CHAPITRE 2 - COUVERTURE - ZINGUERIE
