




Comment activer le suivi phase / poste de travaux dans l'Etude d'exécution ?

Dans Préparation & suivi il est possible de gérer les achats par phase au niveau de l'onglet Etude d'exécution.



Pour activer cette gestion il est nécessaire que la case « Activer la gestion des avancements par phase/poste de travaux » soit cochée.

Aller dans Paramètres > Système > Application > Rubrique Affaire /Chantier / Prévisions financières,

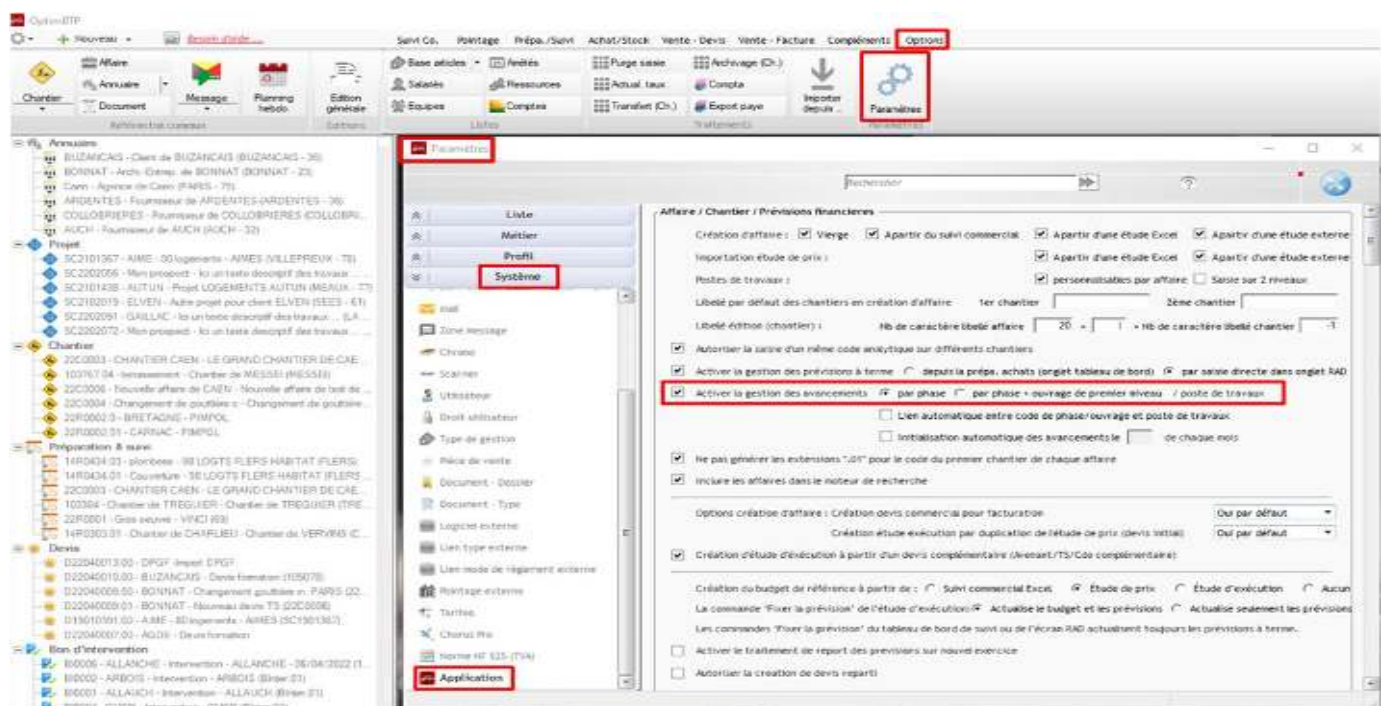

! Fermer et relancer Optim'BTP afin de prendre en compte la modification

Optim'BTP Comment activer le suivi phase / poste de travaux dans l'Etude d'exécution ?

Retourner dans Etude d'exécution, le suivi phase par poste de travaux est activée

The screenshot displays the Optim'BTP software interface. The top menu bar includes 'Etude d'exécution', 'Général', 'Ressources - Planning', 'Préparation actual', 'Sous-traitance', and 'RAD'. A dropdown menu is open under 'Etude d'exécution', showing options: 'Suivi phase/poste', 'Gestion suivi phase / poste de travaux', and 'Avancement par phase / poste de travaux'. The main window shows a tree view on the left with '1 - COUVERTURE TULES' expanded to '1.1 - INSTALLATION DE CHANTIER'. The right pane shows a detailed list of work phases for '1 - plomberie'.

B*	Code	Désignation	Type	UN	Qtd
1		COUVERTURE TULES			
1.1		INSTALLATION DE CHANTIER			
1.1.1	MDECHC	Mise en place d'une roulotte de chantier comprenant vestiaires, douche et sanitaire pendant la durée du chantier		Ens	
1.1.1.1	MDG21B	MAIN OUVRE CHERBOURG 1 B	RT	H	
1.1.1.2	ST_LIBRE	ROULOTTE DE CHANTIER	ST	J	
1.1.1.3	ST_LIBRE	TRANSPORT	ST	Ens	
1.1.1.4	ST_LIBRE	RECHARGE GAZ PROPANE	ST	U	
1.1.1.5	ST_LIBRE	VIVANDE	ST	U	
1.1.2	CLOTURE	Côture de chantier par grilles Heras.		Ens	
1.1.2.1	MDG21B	MAIN OUVRE CHERBOURG 1 B	RT	H	
1.2		CHANTIER 2 - COUVERTURE - ZINGURIE			
